

FFW Albersdorf - Albersdorfer Hauptstraße 41, 94474 Vilshofen an der Donau

Baustellenbegehung, 21.07.2020

Datum: 21.07.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Armin Sittinger **Wetter:** leicht bewölkt, +29°C

Anwesende


Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gerl Reinhard	Stadt Vilshofen an der Donau	Bauherrenvertreter
Sittinger Armin	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung
Able Florian	Veit Fröhler Bau GmbH	Bauunternehmen
Meakin Dominic	TB Pünner	Projektant HLS
Dauscha Stephan	IB Würdinger	Projektant E
Wagner Alexander	FFW Albersdorf	Projektbeteiligter
Krügl Manuel	Zimmerei Holzbau Krügl GmbH	Zimmererarbeiten
Jungbauer Manfred	Zillinger Glasbau	Bauelemente

Baufortschritt

1. Die Innenwände sind größtenteils gemauert.
2. Die Ringanker im OG sind betoniert, derzeit werden die Holzbauteile ausgemauert und die Dämmung auf den Ringankern aufgeklebt.
3. Die Dachkonstruktion ist aufgestellt, derzeit wird mit der Verlegung der Dachelemente begonnen.



Dachkonstruktion, Ausmauerungen etc.

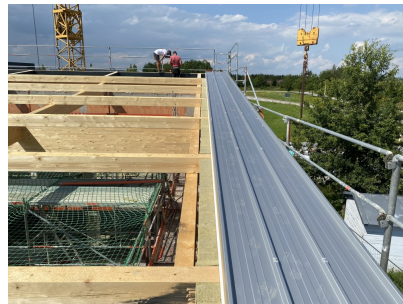

Montage der Dachelemente

Begehungsvermerke

(38) Information	Erstellt am: 09.06.2020
Die Zimmererarbeiten beginnen in KW 26/27. Dauer der Arbeiten ca. 3 Wochen.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(39) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Die Elastomer-Auflager liefert die Fa. Zimmerei Krügl.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)

(40) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Die Abbundpläne hat die Fa. Veit-Fröhler bereits erhalten. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass in der Höhe des Auflagers für den Hauptträger die Stahlplatte und das Elastomer-Auflager zu berücksichtigen sind. Für den Dachstuhl sind seitens der Baufirma keine Befestigungen vorzusehen. Dies erfolgt ggf. durch den Zimmerer selbst.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(41) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Der Kran kann durch den Zimmerer genutzt werden. Die Abstimmung erfolgt zwischen den Firmen Veit-Fröhler und Zimmerei Krügl.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(42) Information	Erstellt am: 09.06.2020
Seitens des Bauablaufes ist vorgesehen, zuerst ist auf den Flachdächern die Notabdichtung aufzubringen, da anschließend das Gerüst aufgestellt wird. Anschließend ist das Hauptdach herzustellen. In der Halle ist das Fangnetz vor den Arbeiten auszuführen. Hinweis: Beim Jour-Fixe wurde die Reihenfolge vertauscht.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(43) Information	Erstellt am: 09.06.2020
Es wurde darauf hingewiesen, dass an den Sandwichplatten des Daches keine Befestigungen möglich sind. Für die Installationen wird seitens des Büro Würdinger ein Detailplan ausgearbeitet, wie die Kabeltrassen verlaufen und die Beleuchtungen angeordnet sind. Laut Herrn Gerl sollen die Kabel nicht sichtbar sein.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) Elektroplanung Würdinger GmbH TB Pünner (Projektant HLS) Elektro Emmer (Elektro) IB Würdinger (Projektant E)
(44) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Hinsichtlich der geplanten PV-Anlage ist noch zu klären, wer Betreiber der Anlage ist. Die Wechselrichter können im Allgemein-Lager angeordnet werden.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) Elektro Emmer (Elektro) IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(45) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Für die Abgasabsaugung ist laut Nachfrage beim Hersteller eine offizielle Anfrage durch die Stadt Vilshofen erforderlich.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter)
(46) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Nach der Fertigstellung des Daches soll mit den Putzarbeiten begonnen werden. Somit sollen die Rohinstallationsarbeiten in etwa 14 Tagen beginnen. Hierzu sollen die Stahlrohrstützen im EG entfernt sein.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) Elektroplanung Würdinger GmbH TB Pünner (Projektant HLS) Elektro Emmer (Elektro) IB Würdinger (Projektant E)
(47) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Der Küchenplan liegt bereits vor und wurde an die Fa. Emmer geschickt. Zur Verteilung ist dieser auch an das Büro maier+maier sowie an das TB Pünner zu mailen.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(48) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Die erforderlichen Installationen für die Kühlzelle wurden den Projektanten Elektro und HLS mitgeteilt.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS)

	Elektroplanung Würdinger GmbH TB Pünner (Projektant HLS) Elektro Emmer (Elektro) IB Würdinger (Projektant E)
(49) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Der Raumteiler im Schulungsraum muss keine Schallschutzanforderungen erfüllen. Die Führungsschiene ist für die Trockenbauarbeiten wichtig. Laut Herrn Gerl ist diese bei der Fa. Zillinger anzufragen.	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(50) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Die Eigenleistungen können gemäß der Aufstellung des Büro maier+maier erfolgen und beinhaltet die Herstellung der Begrünung, Pflasterarbeiten einschl. der Bordsteine, Malerarbeiten (ausgenommen Fahrzeughalle), Metallbauarbeiten (unter Vorbehalt). Die Asphaltierung wird ausgeschrieben.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(51) Information	Erstellt am: 09.06.2020
Das westliche Fenster im OG-Jugendraum kann seitens der Feuerwehr bzw. Landjugend auch als Fenstertüre ausgeführt werden.	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(52) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Im EG - Raum "Kommandant/Erste Hilfe" ist die Wand zur Theke zu verschieben. Dies wurde vor Ort besprochen und festgelegt. Aufgrund der nun asymmetrischen Anordnung der Deckenleuchten wird seitens der Feuerwehr ggf. eine abgehängte Decke ausgeführt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen) Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) Elektro Emmer (Elektro) IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(53) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Ein Farbkonzept wird seitens des Büro maier + maier noch ausgearbeitet und dem Bauherrn vorgelegt. Die Farben der Holzbauteile sind der Zimmerei Krügl möglichst bald mitzuteilen.	Betrifft: maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(54) zu erledigen	Erstellt am: 09.06.2020
Im EG ist der Bereich der Theke mit Bodenfliesen auszuführen. Ebenso soll der Flur im OG gefliest werden.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(56) Information	Erstellt am: 23.06.2020
Die Abgasabsaugung ist laut Fa. S-Tec ca. 50 cm neben dem Fahrzeug zu führen.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS)
(60) zu erledigen	Erstellt am: 23.06.2020
Seitens der FFW wurden Bedenken geäußert, dass sich im Bereich	Betrifft:

des durchlaufenden Dach-Sandwichelementes Probleme aufgrund einer Wärmebrücke ergeben können. Das Büro maier + maier wird sich diesbezüglich mit einem Bauphysiker in Verbindung setzen.	maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(61) zu erledigen	Erstellt am: 23.06.2020
Die FFW wünscht die T30-RS-Türe von der Schleuse in die Fahrzeughalle als verglaste Rohrrahmentüre auszubilden. Die Mehrkosten hierzu werden seitens der BOL eingeholt.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(63) zu erledigen	Erstellt am: 23.06.2020
Für den Dunstabzug der Küche ist eine Wanddurchführung vorzusehen. Diese wird vor den Putzarbeiten durch die Fa. Veit-Fröhler eingebaut.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
(72) Information	Erstellt am: 30.06.2020
Nächste Woche werden die Stahlrohrstützen der Decke über EG entfernt.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
(73) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Der Glattstrich an den Fenstern und Außentüren soll bis nächste Woche hergestellt werden.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
(74) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Für die Lieferung der Sandwichplatten ist eine freie Fläche zu schaffen. Hierzu stimmen sich Herr Able und Herr Krügl ab.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(75) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Ab KW 29 sind die Zimmererarbeiten vorgesehen.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(76) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die sichtbaren Holzteile im Bereich der Fahrzeughalle werden farblos gestrichen. Leimholzteile erhalten keinen Anstrich.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(77) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Abhängung der Installationen im Bereich der Fahrzeughalle erfolgt analog des Feuerwehrhauses in Wallerfing. Das Büro Pünner wird dies entsprechend ausarbeiten.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS)
(78) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Der Kasten für die Absauganlage ist aus Schallgründen evtl. in den Lagerraum zu versetzen. Hier ist beim kommenden Termin am 15.07. abzustimmen, ob ein Abgasschalldämpfer o. ä. vorgesehen ist. Hier geht es auch darum, eine mögliche Nachbarbelästigung zu vermeiden.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(79) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Der Farbton für die Bleche am Pultdach wurde nochmals mit RAL 7016 - Anthrazitgrau bestätigt. Ebenso sind die Holzbauteile des Dachüberstands in diesem Farbton, deckend, zu streichen.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)

(80) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Der Farbton der Attikableche, Fenster, Türen und Tore wurde nochmals bestätigt. RAL 9007 - Graualuminium.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(81) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Das Thema "Wärmebrücke" im Bereich der Sandwich-Dachelemente wurde nochmals thematisiert. Seitens der FFW wurde ein Schnitt an der Unterseite der Elemente durch das Alu-Blech vorgeschlagen. Hierzu wäre aber eine zweite Koppelpfette anzuordnen. Eine Anfrage bei einem Bauphysiker/Energieberater durch das Büro maier+maier ergab, dass eher keine Schäden zu erwarten sind. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen sei eine Kondenswasserbildung an der Unterseite des Daches nicht zu erwarten, zumal sich aufgrund des wesentlich schlechteren U-Wertes der Tore, sich hier eher Kondenswasser sammelt. Das Büro maier+maier wird die weitere Vorgehensweise noch mit Herrn Gerl abstimmen.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(82) Information	Erstellt am: 30.06.2020
Die Fahrzeughalle wird maximal bis 17°C beheizt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(83) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Im Bereich der Stiefelwaschanlage soll ein weiterer Abwasseranschluß vorgesehen werden. Hier ist laut Büro Pünner beim Ausgußbecken auch die Anordnung eines Y-Stücks beim Siphon möglich, um einen Schlauch anzuschließen.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(84) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Seitens der FFW wurde angeregt, evtl. ein weiteres Heizmodul in der Halle für das kurzfristige Aufheizen vorzusehen.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(85) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Angaben zur höhergeführten Torführung liegen bis kommenden Donnerstag vor.	Betrifft: Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(86) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Haustüren EG und OG (Hauptzugänge) sind mit einem Obertürschließer auszustatten. Der Alarmzugang erhält ein Motorschloß. Ein Dauerstrom ist hier vorzusehen.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(87) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Türe von der Küche ins Freie erhält innen einen Knaufzylinder, außen einen Schlüssel. Herr Jungbauer klärt, ob ein E-Öffner für den Chip möglich ist. Ausführung DIN-rechts und kippbar.	Betrifft: Zillinger Glasbau (Bauelemente)

(88) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Das Fenster im Raum "Kommandant" wird wie ursprünglich geplant ausgeführt.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
(89) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Brandschutztüre Schleuse/Fahrzeughalle kostet laut FFW ca. 3.000,00 € netto inkl. Einbau. Hierzu wäre die Türe aus dem Gewerk Baumeisterarbeiten gegenzurechnen.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(90) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die mobile Trennwand im Schulungsraum kostet laut FFW in Glas etwa 7-8 T€ netto zuzüglich Einbau. Das Angebot leitet Herr Wagner an Herr Sittinger weiter.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(91) Information	Erstellt am: 30.06.2020
Der Submissionstermin für das nächste Ausschreibungspaket ist am 14.07.2020.	
(92) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Bodenbeschichtung in der Halle sollte laut FFW als R12 ausgeführt werden, wobei die Anforderung R13 ist. In den Umkleiden sollte R11 hergestellt werden. Wichtig ist die Ausbildung der dauerelastischen Fuge im Bereich Boden-Wand (Sockel). Herr Sittinger nimmt dies entsprechend auf.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(93) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Ein Fenster im OG wird mit einer Drehsperre ausgebildet. Die Art der Griffe kann laut FFW frei gewählt werden. Die weiteren Fenster erhalten einen Kippbeschlag.	Betrifft: Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(94) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Teilung der Tore, ob 3-teilig oder 4-teilig, ist noch festzulegen. Herr Sittinger hat hierzu Skizzen von Herrn Jungbauer erhalten.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(95) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Die Innenfensterbänke werden von der Landjugend/FFW organisiert. Dicke 30 mm, Naturstein.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(96) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Das Fenster im WC-Herren im OG wird mit einer Satinato-Verglasung ausgeführt. Im EG können die Scheiben bei Bedarf auch nachträglich foliert werden.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(97) Information	Erstellt am: 30.06.2020
Die Lieferung der Fenster erfolgt in 4-6 Wochen.	Betrifft: Zillinger Glasbau (Bauelemente)

(98) zu erledigen	Erstellt am: 30.06.2020
Im Anschluß an den Jour-Fixe wurde noch das Thema berührungslose Armaturen für die WC's aufgegriffen. Hierzu fragt Herr Wagner noch bei der Fa. Seuss nach, welche Mehrkosten hier entstehen würden.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(99) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Die Stahlrohrstützen werden diese Woche entfernt. Ebenso wird der Glattnstrich aufgebracht.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)
(100) Information	Erstellt am: 07.07.2020
Die Zimmererarbeiten beginnen nächste Woche.	
(101) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Die Ausführung der Pumpstation für das Abwasser klärt Herr Sittinger mit den Stadtwerken.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
(102) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Herr Gerl leitet die Angaben zur Schließanlage der Fa. Winkhaus an Herrn Sittinger weiter.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter)
(103) Mangel	Erstellt am: 07.07.2020
Die verglaste Brandschutztüre zur Fahrzeughalle soll auf Wunsch der FFW unbedingt ausgeführt werden. Hier sollen die Kosten der Stahlbrandschutztüre einschl. der entfallenen Wand samt Brandschutztüre gegengerechnet werden. Die Mehrkosten würde die FFW übernehmen. Herr Gerl hat darauf hingewiesen, dass eine verglaste Brandschutztüre bei keinem anderen Feuerwehrhaus ausgeführt wurde.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(104) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Die Überdachung an der Westseite des Schulungsraumes soll auf Wunsch der FFW mit einem Glasdach ausgeführt werden. Auf die Notwendigkeit eines möglichen Sonnenschutzes wurde seitens der BOL hingewiesen und ist später Angelegenheit der FFW. Das Vordach könnte ggf. auch unabhängig von der Außentreppe realisiert und vergeben werden. Herr Wagner wird sich hierzu mit Herrn Hirsch, Fa. Metron, zusammensetzen. Seitens des Büro maier+maier wurde die gezeichnete Konstruktion erläutert.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(105) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020
Mit Herrn Dauscha ist abzustimmen, ob die Urinale mit Strom versorgt werden, da die Spülung berührungslos ausgeführt wird.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E)
(106) Information	Erstellt am: 07.07.2020
Für die Fahrzeughalle wird kein weiteres Heizsystem vorgesehen.	Betrifft: Technikerbüro Pünner GmbH (Projektant HLS) TB Pünner (Projektant HLS) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(107) zu erledigen	Erstellt am: 07.07.2020

Die Lieferung der Innenfensterbänke wird bis kommenden Donnerstag geklärt.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(108) Information	Erstellt am: 07.07.2020
Am Freitag, 31.07.2020 findet ab 19.00 Uhr ein Richtfest statt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(109) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Die Zimmererarbeiten beginnen morgen im Bereich des Sozialtraktes, da schlechtes Wetter zu erwarten ist. Zum Schutz der Leimholzträger soll der Bereich Fahrzeughalle dann ab Montag, 20.07.2020 aufgestellt werden.	Betrifft: Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(110) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Für das Ausmauern der Sparren werden etwa 2 Tage angesetzt. Anschließend werden die Dachpaneele verlegt.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(111) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Die Technikgewerke Elektro und HLS beginnen voraussichtlich Ende Juli/Anfang August mit den Arbeiten.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E)
(112) Information	Erstellt am: 14.07.2020
Morgen findet um 14.30 Uhr der Termin mit der Fa. S-Tec hinsichtlich der Abstimmung der Abgasabsaugung statt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(113) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Die Beschaffung der Innenfensterbänke durch die FFW läuft.	Betrifft: FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(114) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Der Termin bei der Fa. Metron wird noch koordiniert. Die Ausführung des Geländers wurde diskutiert. Hier sollte mit der Fa. Metron abgestimmt werden, welche Ausführung durch die Fa. Metron erbracht werden würde.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(115) Information	Erstellt am: 14.07.2020
Der Versand folgender Gewerke steht an: Bodenbeläge, Bodenbeschichtung, Außenanlagen. Die Metallbauarbeiten hängen noch von den Gesprächen mit der Fa. Metron ab.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier + maier architekten gmbh (Architekt) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(116) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Durchdringungen am Dach sind weitestgehend zu vermeiden. Zum einen ist auf die mögliche Montage einer PV-Anlage Rücksicht zu	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)

nehmen, zum anderen darauf, dass die Sicken im Bereich von Durchdringungen komplett von der Traufe bis zum First verblecht werden müssen.	TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
(117) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Es wurde vereinbart, dass Einzellüfter durch die Außenwand geführt werden sollen, die Stragentlüftungen mittels Rohrlüfter gewährleistet werden sollen.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)
(118) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Der Kamin sollte am besten aus dem Flachdach geführt werden. Hier sollten nochmals Abstände mit dem Kaminkehrer abgestimmt werden.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)
(119) zu erledigen	Erstellt am: 14.07.2020
Die Stromversorgung im Bereich der Urinale sind laut Herrn Dauscha vorgesehen.	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS) IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)
(120) Information	Erstellt am: 21.07.2020
Seitens der Fa. Zillinger nahm auch Herr Leberfinger teil. Von der Fa. Emmer war Herr Kaintor vor Ort. Die Feuerwehr bzw. Landjugend war mit 4 später mit 5 Personen vertreten	
(121) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Bezüglich der Ansteuerung bzw. Schließmöglichkeiten der Haustüren im EG und OG wurden die Möglichkeiten besprochen. Nachdem die Türen mit dem Chip geöffnet werden, sollen mittels Schalter die Türen "unversperrt" sein können. Nachdem die Türe wieder auf "versperrt" geschaltet wird, soll die Türe mittels Motorschloß wieder abgeschlossen sein. Durch den Panikbeschlag ist das Öffnen von innen weiterhin gewährleistet. Nachdem die mechanische Variante (Tagesentriegelung) nicht zum Einsatz kommen soll, wird Herr Dauscha die Kosten für die v. g. Variante ermitteln.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E)
(122) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Im Zuge der Besprechung wurde die Ausführung einer Klingelanlage mit Türöffner gefordert. Auch hierzu wird sich Herr Dauscha mit Herrn Jungbauer abstimmen und die Kosten ermitteln.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(123) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Die Türe des Alarmzugangs soll auf Wunsch der FFW nach innen öffnen. Herr Sittinger wird dies im Bezug auf das Brandschutzkonzept prüfen. Hinweis: Die Türe kann nach innen geöffnet werden. Die Information wurde bereits an die Fa. Zillinger weitergegeben.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(124) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Die Befestigung des großen Fensterelementes an der Nordwest-Ecke des Gebäudes ist noch zu klären. Da ein nichttragender Jalousiekasten, wie vorgesehen, eingebaut wurde, ist hier noch eine Lösung zu finden.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) Zillinger Glasbau (Bauelemente)
(125) Information	Erstellt am: 21.07.2020
Es wurde nochmals das Ergebnis des Termins mit der Fa. S-tec hinsichtlich der Abgasabsaugung erläutert. Herr Meakin hat dies in	Betrifft: TB Pünner (Projektant HLS)

seiner Planung eingearbeitet und vorgetragen. Lediglich die Leitungsquerung ist noch unter das Dach zu versetzen, damit auf den Fahrzeugen geübt werden kann. Die Abgasleitung ist in derselben Achse wie der Außenkamin zu führen, damit nur eine Schar verblecht werden muss.	Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)
---	--

(126) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Die Lage der Sirene ist nochmals abzustimmen. Herr Dauscha wird hierzu nochmals Kontakt zum Hersteller aufnehmen.	Betrifft: IB Würdinger (Projektant E) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter)

(127) zu erledigen	Erstellt am: 21.07.2020
Sämtliche Blechteile am Dach (Ortgangleche, Firstbleche etc.) wurden nochmals im Farbton RAL 7016 - Anthrazitgrau bestätigt.	Betrifft: Stadt Vilshofen an der Donau (Bauherrenvertreter) maier+maier architekten gmbh (Bauleitung) FFW Albersdorf (Projektbeteiligter) Zimmerei Holzbau Krügl GmbH (Zimmererarbeiten)

(128) Information	Erstellt am: 21.07.2020
Vor Beginn der Installationsarbeiten wird die Fa. Veit-Fröhler noch die V60S4-Schweißbahn auf der Bodenplatte verlegen lassen. Dies erfolgt am kommenden Dienstag, 28.07.2020.	Betrifft: Veit Fröhler Bau GmbH (Bauunternehmen)

(129) Information	Erstellt am: 21.07.2020
Bei der Abstimmung zur Ausführung der Hebeanlage wurde der Einbau einer zweiten Pumpe angefragt, um bei einem Ausfall der Pumpe im Hinblick auf Festlichkeiten o. ä. unabhängiger zu sein. Herr Sittinger wird hierzu Kosten einholen bzw. die Möglichkeit prüfen, einen größeren Behälter vorzusehen.	Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Bauleitung)
