

Sanierung 6WE Schweiklbergstr. 12a - Schweiklbergstr. 12a, 94474 Vilshofen

Baustellenbegehung, 23.07.2020

Datum: 23.07.2020, 14:15 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 28°, heiter

Anwesende

| Name | Firma (ggf.) | Gewerk / Funktion |
|------|--------------|-------------------|
|------|--------------|-------------------|

Baufortschritt


Dach komplett fertig eingedeckt, Dachrinnen montiert
Betonvordach und kleine Seitenbalkone am Giebel abgestemmt
Kamine abgebaut und unter Dach mit Beton abgedeckt/Verschlossen



Neues DachSeitenbalkone entfernt



Vordach abgestemmt

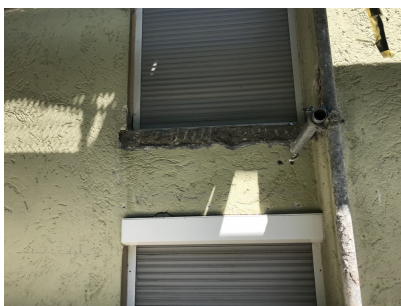

Kleine Seitenbalkone abgebrochen







Kamine abgebaut und unter Dach mit Beton abgedeckt/Verschlossen

Begehungsvermerke

| | |
|--|--|
| (2) Information | Erstellt am: 03.07.2020 / Fälligkeit: 09.07.2020 |
| Aufstellen des Krans erfolgt am 9/10.Juli. | Betrifft: Brandner (Zimmererarbeiten) |

| | |
|---|--|
| (7) Information | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 24.07.2020 |
| Morgen Früh ab 7.00 Uhr wird der Baukran abgebaut. (Fa. Brandner) | Betrifft: |

| | |
|--|--|
| | Malerbetrieb (Malerarbeiten) Bauunternehmen (Bauunternehmen) Brandner (Zimmererarbeiten) |
| (8) Information | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 27.07.2020 |
| Anlieferung des Sanitärcontainers für die Betroffenen der Badsanierungen morgen früh 10.00 Uhr. Fa. Brandner hält Unterlegbalken bereit zum Höhenausgleich, damit der Container waagrecht aufgestellt werden kann. Anschluss an Wasser und Abwasser durch Fa. Seuß, Anschluß an Stromnetz durch TuE. | Betrifft: BETRIFFT ALLE GEWERKE |
| (9) Restarbeit | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 27.07.2020 |
| Bis spätestens Montag früh bei Beginn der Dämmarbeiten sind fassadenseitig alle Elektrogegenstände abzubauen. (Leuchtkörper an Fassade und Balkonen, Bewegungsmelder, Heizungsfühler, Klingelanlage usw.). Außerdem sind die Einbauteile für Briefkästen und neuer Sprechanlage zu montieren. | Betrifft: Elektro (Elektro) |
|  |  |
|  | |
| (10) Mangel | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 31.07.2020 |
| Der Lüfterfirst ist von innen noch verschlossen! Damit die Entlüftung funktionieren kann, ist ein Luftaustritt zu gewährleisten. | Betrifft: Brandner (Zimmererarbeiten) |
|  | |
| (11) Mangel | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 24.07.2020 |
| Die auf der Zufahrt gelagerten Dämmplatten müssen bis morgen, 10.00 Uhr (Anlieferung Sanitärcontainer) entfernt werden. Behindern die Anlieferung!!! | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) |
| (12) Restarbeit | Erstellt am: 23.07.2020 / Fälligkeit: 29.07.2020 |
| Die Standrohre der 4 Regenwassereinflüsse sind wegen VWS noch um | Betrifft: |

20-25 cm nach außen zu verlegen. Eilt!!!

Bauunternehmen (Bauunternehmen)

