

Dach-/Fassadensan. Spitalhofstr.22a - Spitalhofstr. 22a, 94032 Passau

Baustellenbegehung, 30.06.2020


Datum: 30.06.2020, 14:00 Uhr **Bauleiter:** Leonhard Maier **Wetter:** 25°, sonnig, leicht bewölkt

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donaureuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Menz Thomas	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Ernst Gerhard	Stahlbau Ernst GmbH	Metallbau

Baufortschritt

Stahlbau Ernst: Montage der Balkongeländerkonstruktion in den obersten 4 Stockwerken
Malerbetrieb Menz: Balkonnischen 1x weiß gestrichen

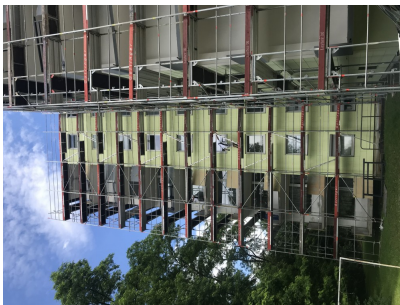

Montage oberste Balkongeländer



Fassaden fertig gestrichen, Balkone in Bearbeitung

Begehungsvermerke

(24) Information Besichtigung der Wohnung Synek im obersten Stock links: Durch die Dacharbeiten sind im Decken und anschließenden Wandbereich in einzelnen Räumen durch Fibrationen beim Bohren Putzrisse entstanden, die malermässig nach Abschluss der Bauarbeiten behandelt werden.	Erstellt am: 26.05.2020
(41) Restarbeit Fassadengerüst ist an den Seiten ohne Balkone abzubauen!!!	Erstellt am: 30.06.2020 / Fälligkeit: 02.07.2020 Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)
(42) Mangel Begehung in Spitalhofstr. 22b-Balkon WE Ebner: - Versehentliche Blindnieten an den Füllungen stehen innen über. Kürzen bzw. entfernen und Bohrungen mit Kappen schliessen.	Erstellt am: 30.06.2020 Betrifft: Stahlbau Ernst GmbH (Metallbau)

